



Suivi des préparations de travail

Guide d'installation et d'utilisation

Lignes HTB — EEL Limoges & EEL Aurillac

Version du 18 août 2026

niamort36-prog.github.io/TableauSuiviPrepa

Sommaire

1. Installer l'application
2. L'écran d'accueil
3. Créer et remplir un chantier
4. Les tâches et leurs dates butoir
5. Les détails techniques
6. Logistique & Terrain
 1. Gîtes et dépenses communes
 2. Points d'intérêt
 3. Contacts
 4. Chargement
 5. Technique
 6. Mode opératoire
 7. Planning
 8. Notes
7. Partager un chantier en lecture seule
8. Imprimer le porte-document A3
9. Les options : équipes et lignes
10. Les archives
11. Sur téléphone
12. Questions fréquentes

1. Installer l'application

Il n'y a rien à installer au sens habituel : l'application vit sur une page web. Elle s'ouvre dans n'importe quel navigateur récent, sur ordinateur comme sur téléphone, à cette adresse :

<https://niamort36-prog.github.io/TableauSuiviPrepa/>

Aucun compte, aucun mot de passe. Les données sont partagées en temps réel entre tous ceux qui ouvrent l'adresse : ce qu'une personne enregistre apparaît chez les autres.

La garder sous la main

Plutôt que de retaper l'adresse, ajoutez un raccourci :


APPAREIL	COMMENT FAIRE
Ordinateur Chrome ou Edge	Menu  en haut à droite, puis <i>Enregistrer et partager</i> → <i>Créer un raccourci</i> . Cochez <i>Ouvrir dans une fenêtre</i> pour que l'application s'ouvre sans barre d'adresse.
Android Chrome	Menu  , puis <i>Ajouter à l'écran d'accueil</i> .
iPhone / iPad Safari	Bouton <i>Partager</i> (le carré avec une flèche), puis <i>Sur l'écran d'accueil</i> .

Après une mise à jour de l'application, le navigateur peut continuer à afficher l'ancienne version pendant une dizaine de minutes. Forcez le rechargement avec **Ctrl + F5** sur ordinateur. Si cela ne suffit pas, ajoutez **?v=2** à la fin de l'adresse : le navigateur la considère comme nouvelle et ne peut plus servir sa copie en cache.

Hors réseau, l'application ne se charge pas et les modifications ne partent pas. Sur les chantiers mal couverts, préparez ce qui doit l'être avant de partir, ou utilisez le lien de partage sur un téléphone déjà connecté.

2. L'écran d'accueil

L'accueil liste les chantiers **en cours** de l'équipe affichée, du plus proche au plus lointain. Chaque carte se lit d'un coup d'œil.

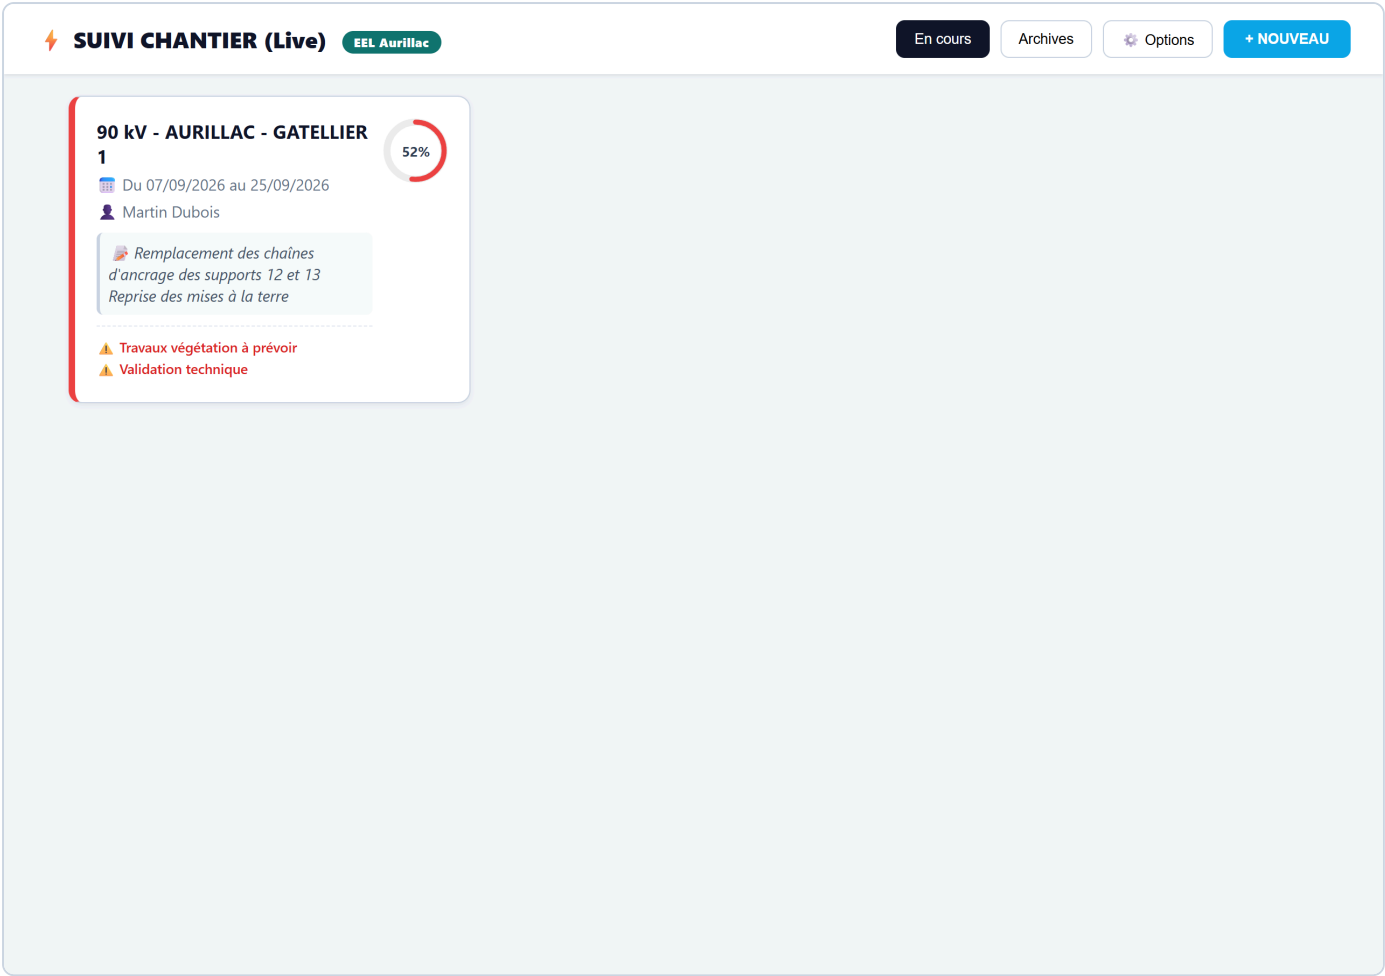

L'accueil, avec la pastille d'équipe en haut à gauche

ÉLÉMENT	CE QU'IL INDIQUE
Bordure verte	Aucune date butoir dépassée ni proche.
Bordure jaune	Une échéance approche.
Bordure rouge	Au moins une date butoir est dépassée.
Jauge	Part des tâches renseignées, sur les 25 tâches du suivi.
Liste d'alertes	Les tâches en retard (⚠) ou proches de l'échéance (⌚).
 Déplacement	Le chantier nécessite un déplacement.

Un clic sur une carte ouvre le chantier. Le bouton + **NOUVEAU** en crée un dans l'équipe affichée.

3. Créer et remplir un chantier

La fiche rassemble l'identité du chantier : la ligne concernée, les personnes, les dates, les numéros d'ordre et la description des travaux.

The screenshot shows a web interface for 'SUIVI CHANTIER (Live)'. At the top, there's a header with 'EEL Aurillac' and buttons for 'En cours', 'Archives', 'Options', and '+ NOUVEAU'. Below the header, a dark blue bar displays the project title '90 KV - AURILLAC - GATELLIER 1' and 'Code Liaison: 4017'. A circular progress indicator shows '52%'. The main form contains several fields: 'ÉQUIPE' (EEL Aurillac), 'LIGNE HTB' (4017 - AURILLAC - GATELLIER 1), 'CHARGÉ DE TRAVAUX (CDT)' (Martin Dubois), 'CDT SUPPLÉANT' (Claire Perrot), 'DÉBUT CHANTIER' (07/09/2026), 'FIN CHANTIER' (25/09/2026), 'DÉBUT CONSIGNATION' (08/09/2026), and 'FIN CONSIGNATION' (24/09/2026). At the bottom, there are buttons for 'Archiver', 'Prépa', 'Logistique', 'Imprimer A3', and a large green 'ENREGISTRER' button.

Le haut de la fiche : équipe, ligne, intervenants et dates

Les champs

- **Équipe** — détermine dans quelle liste le chantier apparaît. C'est aussi ici qu'on déplace un chantier d'une équipe à l'autre.
- **Ligne HTB** — choisie dans le référentiel de l'équipe. Le titre de la fiche reprend automatiquement la tension et le nom de la ligne.
- **Début et fin de chantier** — la date de début sert de référence à tout le calcul des échéances, et détermine les semaines du planning. C'est le champ le plus important de la fiche.
- **N° OT et N° OI** — tapez le numéro puis *Entrée*, il s'ajoute en pastille. La croix le retire.
- **Commentaires internes** — en bas de la fiche, pour les remarques d'équipe.

Rien n'est enregistré tant que vous n'avez pas cliqué sur ENREGISTRER. Le bouton vert est toujours visible en bas de l'écran.

4. Les tâches et leurs dates butoir

Sous la fiche, les 17 tâches du suivi sont réparties en cinq familles. Chacune a un délai propre, compté **en arrière depuis la date de début du chantier**. Une tâche à 90 jours doit donc être faite trois mois avant le démarrage.

SUIVI CHANTIER (Live) EEL Aurillac

En cours

Archives

Options

+ NOUVEAU

Commande du matériel		NON OUI
Réception matériel		NON OUI
Chargement matériel	Butoir : 06/09/2026	NON OUI
2. PLANIFICATION DE L'INTERVENTION		
DT/DICT, demande SNCF, autre...		NON OUI
Expression de besoins particulier (MALT, RH...)		NON OUI
3. OUTILLAGE		
Devis moyen externe (nacelle...)		NON OUI
Vérification contrôle règlementaires engins		NON OUI
4. RESSOURCES		
Durée du chantier		3 semaines
Nombre d'agents		5
Véhicule équipe particulier (nacelle, treuil...)		NON OUI

Archiver

Prépa

Logistique

Imprimer A3

ENREGISTRER

Chaque ligne affiche sa date butoir tant qu'elle n'est pas traitée

COULEUR	SIGNIFICATION
Vert	Traitée : vous avez répondu OUI ou NON.
Jaune	L'échéance approche — un mois avant pour les tâches à 30 jours ou plus, cinq jours avant pour les autres.
Rouge	La date butoir est passée et la tâche n'est pas traitée.
Blanc	Pas encore d'échéance, ou tâche sans délai.

NON compte autant que OUI. La jauge mesure ce qui a été *traité*, pas ce qui a été fait. Répondre NON à une tâche sans objet la sort des alertes : c'est voulu, une question tranchée n'est plus un risque.

Les deux lignes *Durée du chantier* et *Nombre d'agents* attendent une saisie libre, pas une réponse OUI/NON. Elles comptent dans la jauge dès qu'elles sont remplies.

5. Les détails techniques

Le bouton  **Prépa** ouvre la liste des documents à produire : NIP, constat d'adéquation, mode opératoire, calculs, PPE, MALT/CC, listes de matériel et d'outillage.

 **SUIVI CHANTIER (Live)** EEL Aurillac

En coursArchivesOptions+ NOUVEAU

← Retour

DÉTAILS TECHNIQUES

DOCUMENTS TECHNIQUES

NIP	Butoir : 31/08/2026	NON	OUI
Constat Adéquation		NON	OUI
Mode Opérateur	Lien dossier... 	NON	OUI
Calculs	Lien dossier... 	NON	OUI
PPE	Lien dossier... 	NON	OUI
MALT/CC		NON	OUI
Liste Matériel		NON	OUI
Liste Outillage		NON	OUI

RetourENREGISTRER TOUT

Les documents techniques, avec un lien de dossier pour trois d'entre eux

Trois documents acceptent un **lien de dossier** : mode opératoire, calculs et PPE. Collez-y un chemin réseau ou une adresse, le bouton  l'ouvre.

Un chemin local du type `K:\Dossiers\...` ne peut pas être ouvert depuis une page web : les navigateurs l'interdisent pour des raisons de sécurité. Le champ reste utile pour *noter* l'emplacement, mais il faudra le copier à la main dans l'explorateur.

6. Logistique & Terrain


Le bouton  **Logistique** ouvre un espace à huit onglets qui rassemble tout ce qui entoure le chantier. Son en-tête rappelle la ligne et le **numéro d'OI** saisi sur la fiche, pour qu'on sache toujours de quel ordre il s'agit.

Aucune de ces informations n'entre dans le calcul d'avancement : la jauge ne bouge pas quand vous les remplissez.

C'est aussi cet espace, et lui seul, que voient les personnes à qui vous transmettez le lien de partage.

6.1 Gîtes et dépenses communes

Qui dort où, combien de nuits, qui a payé — et la répartition calculée toute seule. Deux listes : autant de **gîtes** et autant de **dépenses communes** que nécessaire, chacun avec son intitulé.

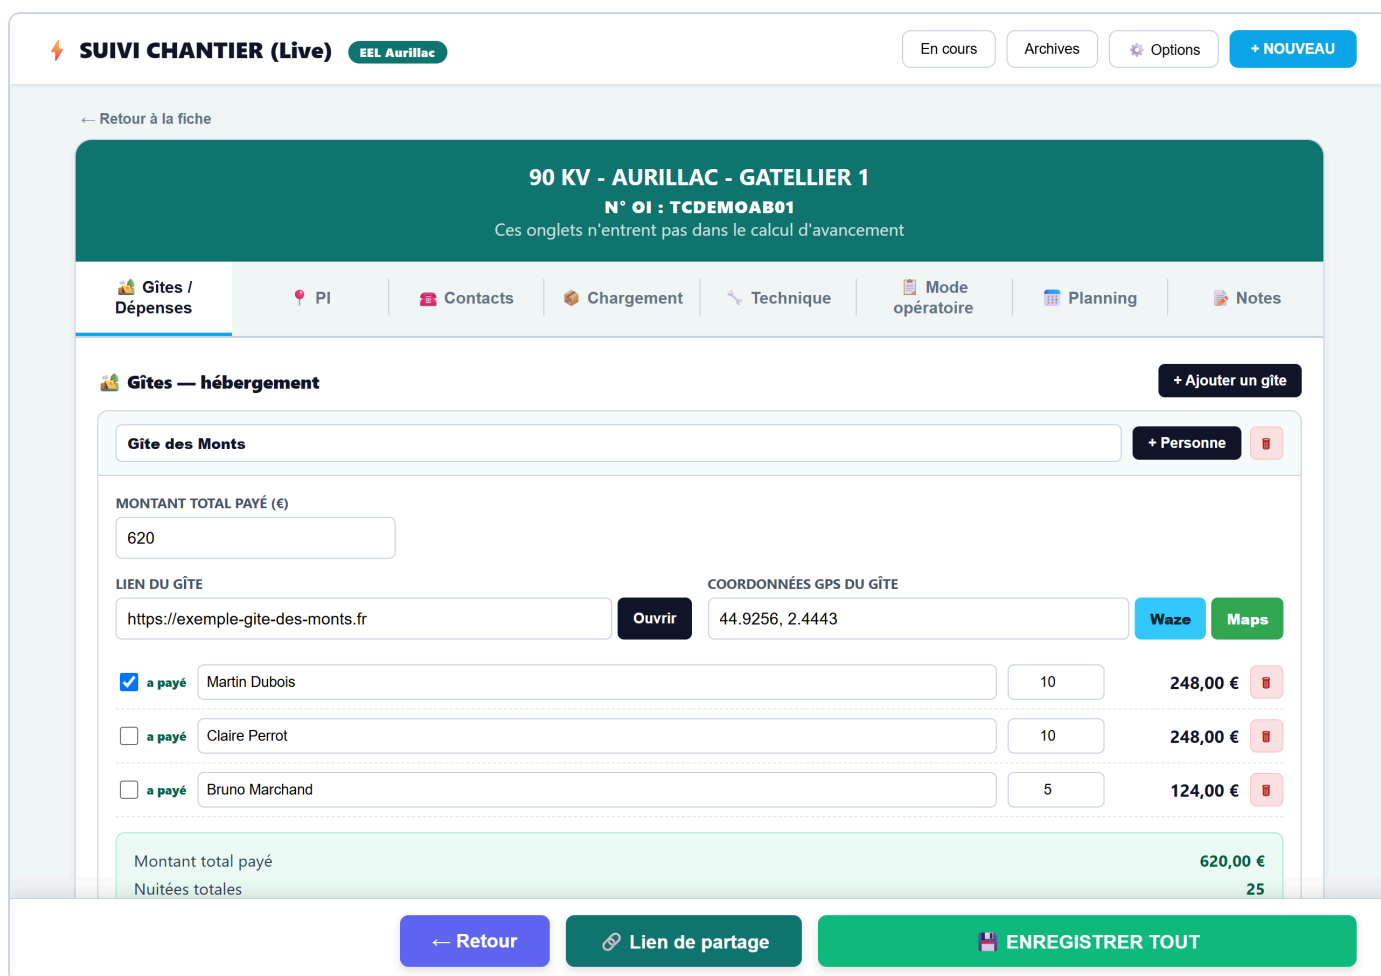

SUIVI CHANTIER (Live) EEL Aurillac

En cours Archives Options + NOUVEAU

← Retour à la fiche

90 KV - AURILLAC - GATELLIER 1
N° OI : TCDEMOAB01
Ces onglets n'entrent pas dans le calcul d'avancement

Gîtes / Dépenses PI Contacts Chargement Technique Mode opératoire Planning Notes

Gîtes — hébergement + Ajouter un gîte

Gîte des Monts + Personne

MONTANT TOTAL PAYÉ (€)
620

LIEN DU GÎTE
https://exemple-gite-des-monts.fr Ouvrir

COORDONNÉES GPS DU GÎTE
44.9256, 2.4443 Waze Maps

☒ a payé	Martin Dubois	10	248,00 €	
☐ a payé	Claire Perrot	10	248,00 €	
☐ a payé	Bruno Marchand	5	124,00 €	

Montant total payé 620,00 €
Nuitées totales 25

← Retour Lien de partage ENREGISTRER TOUT

Le gîte se répartit au prorata des nuits, les courses à parts égales

- Un chantier peut compter plusieurs hébergements — deux gîtes, un gîte et un hôtel — et plusieurs dépenses à partager : courses, carburant, péages.
- Ajoutez les personnes présentes, avec leur nombre de nuits pour le gîte.
- Cochez **a payé** sur la ligne de celle qui a réglé. Une seule à la fois.
- Saisissez le montant total : le coût par nuitée et la part de chacun s'affichent, puis le **règlement** — qui doit combien à qui, le payeur exclu.

- Le gîte accepte en plus un **lien** et des **coordonnées GPS**, avec ouverture directe dans Waze ou Maps.
- Les **reçus PDF** s'importent sur les deux blocs et se téléchargent ensuite, y compris depuis le lien de partage. Trois mégaoctets maximum par fichier.

Le bouton **Reprendre les personnes des gîtes**, sur une dépense, recopie tous les noms présents dans les gîtes, sans doublon : de quoi éviter une double saisie.

6.2 Points d'intérêt

Les lieux utiles : rassemblement, accès, base travaux. Chaque point s'ouvre d'un clic dans Waze ou dans Google Maps.

Un badge « ✓ GPS » confirme que les coordonnées ont été reconnues

Le plus simple est de **coller un lien de partage** depuis Google Maps ou Waze : les coordonnées en sont extraites automatiquement. Une saisie manuelle (45.8234, 1.2612) fonctionne aussi, virgule décimale française comprise, tout comme une adresse en toutes lettres.

Un lien raccourci `maps.app.goo.gl` ne peut pas être décodé par la page. Il est alors conservé tel quel et s'ouvrira directement dans l'application de cartographie : le résultat est le même pour vous.

6.3 Contacts

Les numéros utiles, rangés dans les catégories que vous créez : RTE, sous-traitants, secours, ce que vous voulez.

The screenshot shows a web application interface for 'SUIVI CHANTIER (Live)'. At the top, there's a header with 'EEL Aurillac' and buttons for 'En cours', 'Archives', 'Options', and '+ NOUVEAU'. Below the header, a dark green banner displays '90 KV - AURILLAC - GATELLIER 1' and 'N° OI : TCDEMOAB01', with a note 'Ces onglets n'entrent pas dans le calcul d'avancement'. A navigation bar contains tabs: 'Gîtes / Dépenses', 'PI', 'Contacts' (active), 'Chargement', 'Technique', 'Mode opératoire', 'Planning', and 'Notes'. The 'Contacts du chantier' section has '+ Contact' and '+ Nouvelle catégorie' buttons. It lists two contacts under the 'RTE' category. The first contact, 'Martin Dubois', has fields for name, phone number (06 00 00 00 01), role (Chargé de travaux), and email (martin.dubois@exemple.fr). Below these are buttons for 'Appeler', 'SMS', and 'Mail'. The second contact, 'Claire Perrot', has fields for name, phone number (06 00 00 00 02), role (Chargée de consignation), and email (Adresse e-mail (facultatif)). Below these are buttons for 'Appeler' and 'SMS'. At the bottom, there are buttons for 'Retour', 'Lien de partage', and 'ENREGISTRER TOUT'.

Appeler, envoyer un SMS ou un courriel depuis la fiche

Le bouton **Mail** n'apparaît que si une adresse valide est renseignée. Sans numéro, **Appeler** et **SMS** restent visibles mais inactifs. Supprimer une catégorie ne supprime pas ses contacts : ils passent dans *Sans catégorie*.

6.4 Chargement

Cet onglet fait le lien avec **Invent'RTE**, l'application d'inventaire, et donne accès aux paniers de chargement du chantier.

 **ENREGISTRER TOUT**

7. Partager un chantier en lecture seule

Depuis l'espace Logistique, le bouton  **Lien de partage** copie une adresse à transmettre. Celui qui l'ouvre ne voit **que** cet espace : ni la liste des chantiers, ni la fiche, ni les options.

Vue partagée — lecture seule

Ces informations sont consultables mais ne peuvent pas être modifiées depuis ce lien.

90 KV - AURILLAC - GATELLIER 1

N° OI : TCDEMOAB01

Du 07/09/2026 au 25/09/2026 — CdT Martin Dubois

Gîtes / Dépenses

PI

Contacts

Chargement

Technique

Mode opératoire

Planning

Notes

Gîtes — hébergement

Gîte des Monts

MONTANT TOTAL PAYÉ (€)

620,00 €

Lien du gîte

https://exemple-gite-des-monts.fr

Ouvrir

COORDONNÉES GPS DU GÎTE

44.9256, 2.4443

Waze

Maps

✓ a payé

Martin Dubois

10 nuits

248,00 €

Claire Perrot

10 nuits

248,00 €

Bruno Marchand

5 nuits

124,00 €

Montant total payé

620,00 €

Nuitées totales

25

Coût par nuitée

24,80 €

Règlement

Claire Perrot doit à Martin Dubois

248,00 €

Bruno Marchand doit à Martin Dubois

124,00 €

La vue partagée : un bandeau signale la lecture seule


DEPUIS LE LIEN DE PARTAGE	POSSIBLE ?
Consulter les huit onglets	Oui
Ouvrir Waze, Maps, un panier	Oui
Appeler, envoyer un SMS ou un courriel	Oui
Télécharger les reçus	Oui
Publier une note	Oui
Modifier quoi que ce soit d'autre	Non

Le lien affiche ce qui est en base, pas ce qui est à l'écran. Enregistrez avant de le transmettre.

Ce lien n'est protégé par aucun mot de passe. Quiconque le reçoit peut le transmettre. La lecture seule évite les modifications accidentelles, elle ne protège pas d'une diffusion non souhaitée : réfléchissez avant d'y mettre des informations sensibles.

8. Imprimer le porte-document A3

Le bouton  **Imprimer A3** produit une feuille A3 en paysage dont seule la moitié droite est occupée. Pliée en son centre, elle devient un porte-document avec la fiche chantier en couverture.

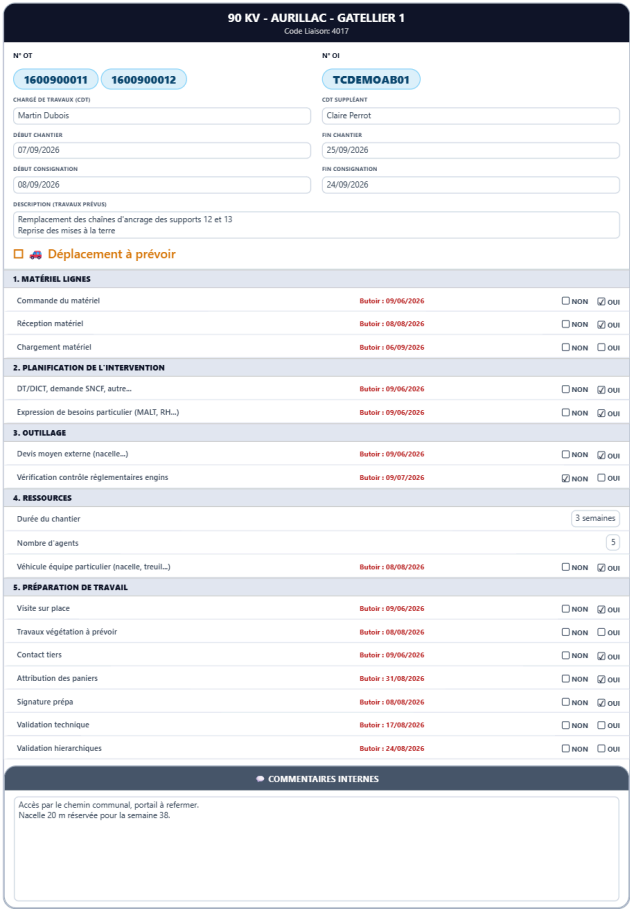

90 KV - AURILLAC - GATELLIER 1
Code Liaison: 4077

N° OT: 1600900011, 1600900012
N° OI: TCDEMOAB01

CHARGE DE TRAVAIL (CPT): Martin Dubois
CET SUPPLÉANT: Claire Perrot

DÉBUT CHANTIER: 07/09/2026
FIN CHANTIER: 25/09/2026

DÉBUT CONSIGNATION: 08/09/2026
FIN CONSIGNATION: 24/09/2026

DESCRIPTION (TRAVAUX PRÉVUS):
Remplacement des chaînes d'ancrage des supports 12 et 13
Reprise des mises à la terre

☐ Déplacement à prévoir

1. MATÉRIEL LIGNES

Commande du matériel	Butoir : 09/06/2026	☐ NON ☒ OUI
Réception matériel	Butoir : 08/08/2026	☐ NON ☒ OUI
Chargement matériel	Butoir : 06/09/2026	☐ NON ☒ OUI

2. PLANIFICATION DE L'INTERVENTION

DT/DICT, demande SNCF, autre...	Butoir : 09/06/2026	☐ NON ☒ OUI
Expression de besoins particulier (MALT, RH...)	Butoir : 09/06/2026	☐ NON ☒ OUI

3. OUTILLAGE

Devis moyen externe (nacelle...)	Butoir : 09/06/2026	☐ NON ☒ OUI
Vérification contrôle réglementaires engins	Butoir : 09/07/2026	☒ NON ☐ OUI

4. RESSOURCES

Durée du chantier: 3 semaines

Nombre d'agents: 5

Véhicule équipe particulier (nacelle, treuil...)
Butoir : 08/08/2026 ☐ NON ☒ OUI

5. PRÉPARATION DE TRAVAIL

Visite sur place	Butoir : 09/06/2026	☐ NON ☒ OUI
Travaux végétation à prévoir	Butoir : 08/08/2026	☐ NON ☒ OUI
Contact tiers	Butoir : 09/06/2026	☐ NON ☒ OUI
Attribution des paniers	Butoir : 31/08/2026	☐ NON ☒ OUI
Signature prépa	Butoir : 08/08/2026	☐ NON ☒ OUI
Validation technique	Butoir : 17/08/2026	☐ NON ☒ OUI
Validation hiérarchiques	Butoir : 24/08/2026	☐ NON ☒ OUI

COMMENTAIRES INTERNES

Accès par le chemin communal, portail à refermer.
Nacelle 20 m réservée pour la semaine 38.

Le trait de pli au centre, la fiche sur la moitié droite

Les **numéros d'OT et d'OI** sont remontés juste sous l'en-tête et grossis : ce sont les références qu'on cherche en premier sur le papier.

La fiche imprimée est allégée par rapport à l'écran : la jauge, le champ Équipe et le rappel de la ligne disparaissent — l'en-tête les donne déjà. Les aplats de couleur sont retirés, le statut restant lisible par les cases cochées. Les dates butoir sont affichées pour **toutes** les tâches, y compris celles déjà traitées, ce qui donne le calendrier complet du chantier. Le bloc de commentaires est agrandi pour écrire à la main.

Dans la fenêtre d'impression, vérifiez que le format est bien sur **A3** et les marges sur **Aucune**. Selon le pilote d'imprimante, il faut parfois le forcer.

La mise en page s'adapte toute seule au contenu : plus la fiche est remplie, plus elle est réduite, mais elle occupe toujours exactement la hauteur et la largeur utiles.

9. Les options : équipes et lignes

SUIVI CHANTIER (Live) EEL Aurillac

En coursArchivesOptions+ NOUVEAU

Options

ÉQUIPES

Chaque équipe a sa propre liste de chantiers et son propre référentiel de lignes : un même code peut désigner deux lignes différentes selon l'équipe.

+ Nouvelle équipe

EEL Aurillac	1 chantier	✓ Équipe affichée	Supprimer
EEL Limoges	29 chantiers	Basculer sur cette équipe	Supprimer

AJOUTER UNE LIGNE

DOMAINE DE TENSION

CODE

NOM DE LA LIGNE

63 kV

ex : 4080

ex : Chatelus - Maureix

+ Ajouter

LIGNES DE EEL Aurillac (145)

Filter par code ou par nom...

63 kV		
3001	CASTELNAU - MISTROU	Supprimer
3007	CAJARC - GODIN	Supprimer
3010	GODIN - PENCHOT 1	Supprimer

Les équipes en haut, le référentiel de lignes en dessous

Changer d'équipe

Chaque équipe a **sa liste de chantiers et son propre référentiel de lignes**. Le bouton **Basculer sur cette équipe** change l'affichage ; l'équipe active porte un bandeau vert, et une pastille la rappelle en permanence dans la barre du haut. Le choix est mémorisé sur l'appareil.

Les référentiels sont séparés parce qu'un même code peut désigner deux lignes différentes : le **4015** est *Boriette – Montignac* à Limoges et *Boriette – Marcillac* à Aurillac. Un référentiel commun en aurait écrasé une.

Une équipe ne peut pas être supprimée tant que des chantiers y sont rattachés : ils disparaîtraient de toutes les listes. Réaffectez-les d'abord depuis leur fiche.

Gérer les lignes


La liste affiche les lignes de l'équipe affichée, groupées par niveau de tension, avec un filtre par code ou par nom. Pour ajouter une ligne : domaine de tension, code, nom. Les doublons de code sont refusés.

Supprimer une ligne utilisée par des chantiers est possible — un avertissement indique combien — et ces chantiers restent lisibles : la ligne y est signalée (*ligne supprimée*).

10. Les archives

Le bouton  **Archiver**, sur la fiche, sort le chantier de la liste des travaux en cours sans rien perdre. On le retrouve dans l'onglet **Archives**.

Les archives s'accumulent, elles sont rangées dans des **dossiers mensuels**, du plus récent au plus ancien, d'après la date de début du chantier. Seul le mois le plus récent est ouvert : un clic sur un dossier le déplie. Les chantiers sans date de début sont regroupés à la fin.

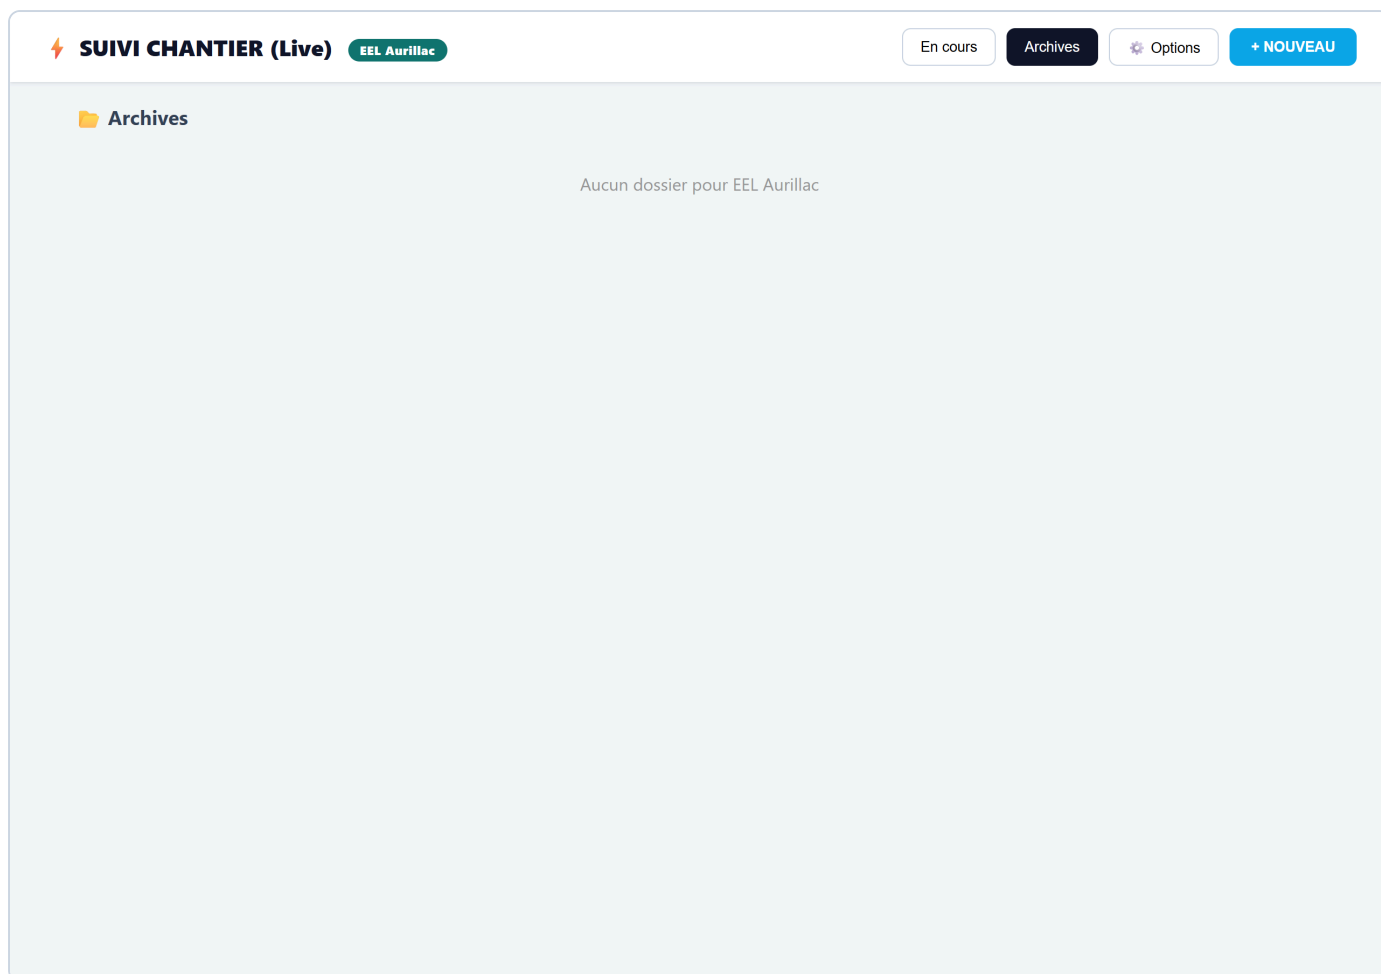

Les chantiers archivés de l'équipe affichée

La suppression définitive n'est possible que depuis les archives, par la croix rouge en haut de la carte. Elle emporte aussi les reçus du chantier.

Une suppression est irréversible. Il n'y a pas de corbeille. Dans le doute, archivez plutôt que de supprimer : un chantier archivé ne gêne personne.

11. Sur téléphone

Toutes les mises en page s'adaptent à l'écran, en portrait comme en paysage.

Vue partagée — lecture seule
Ces informations sont consultables mais ne peuvent pas être modifiées depuis ce lien.

90 KV - AURILLAC - GATELLIER 1
N° OI : TCDEMOAB01
Du 07/09/2026 au 25/09/2026 — CdT Martin Dubois

Gîtes / Dépenses | **PI** | **Contacts**
Chargement | **Technique** | **Mode opératoire**
Planning | **Notes**

Gîtes — hébergement

Gîte des Monts

MONTANT TOTAL PAYÉ (€)
620,00 €

LIEN DU GÎTE
<https://exemple-gite-des-monts.fr> **Ouvrir**

COORDONNÉES GPS DU GÎTE
44.9256, 2.4443 **Waze** **Maps**

✓ a payé

Martin Dubois
10 nuits **248,00 €**

La vue partagée sur téléphone, en portrait

- Le formulaire passe sur une colonne, les lignes de tâches s'empilent.
- Les huit onglets se répartissent sur trois rangées, sans rien tronquer.
- Le planning abandonne le tableau : chaque journée devient une carte empilant matin et après-midi.
- En paysage, la barre du haut se libère pour récupérer de la hauteur, et les grilles repassent sur deux colonnes.

C'est sur le terrain que le **lien de partage** prend tout son sens : les coordonnées s'ouvrent dans Waze d'un doigt, les contacts s'appellent d'un doigt, et personne ne risque de modifier la préparation par mégarde.

12. Questions fréquentes

Je ne vois pas mes chantiers

Vérifiez la pastille d'équipe en haut à gauche. Chaque équipe a sa propre liste ; vous regardez peut-être celle de l'autre. Le changement se fait dans **Options**.

Je ne vois pas les dernières nouveautés

Votre navigateur affiche une copie en cache. `Ctrl + F5` sur ordinateur, ou ajoutez `?v=2` à la fin de l'adresse.

Le planning est vide

Les semaines se déduisent des dates de début et de fin du chantier. Renseignez-les sur la fiche.

La jauge ne bouge pas quand je remplis la logistique

C'est normal. La jauge ne mesure que les 25 tâches du suivi de préparation. Tout ce qui se trouve dans **Logistique & Terrain** en est volontairement exclu.

Je n'arrive pas à ajouter un reçu

Le chantier doit être enregistré au préalable — le reçu s'y rattache par son identifiant. Vérifiez aussi qu'il s'agit bien d'un PDF de moins de trois mégaoctets.

Deux personnes peuvent-elles travailler en même temps ?

Oui pour les **notes** et les **reçus**, écrits en base immédiatement. Pour le reste, le dernier qui enregistre écrase le travail de l'autre : mettez-vous d'accord avant de remplir la même fiche à deux.

Où sont stockées les données ?

Dans une base Firebase hébergée en Europe. Elles ne sont pas chiffrées et l'accès n'est pas protégé par mot de passe : n'y mettez rien qui ne puisse être lu par quelqu'un d'extérieur.
